

|                                                                                   |                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>WERFVERSLAG</b><br>Werfverslag nr. 14                     | Datum: vr 9/10/2026      |
|                                                                                   | Werf: Lindenhofstraat 12, Ravelgem                           | Opgesteld: Sarah Janssen |
|                                                                                   | Aanwezig: Jos Maes, Lien Claes, Hilde De Cock, Kevin Mertens |                          |

## NIEUW DIT WERFBEZOEK (11)

### 1 Tegels badkamer: keuze bouwheer

VAKGEBIED afwerking · WIE Jonas Vermeiren · TEGEN vr 23/10

Familie De Cock twijfelt tussen 60x60 en 30x60. Staalkaart is meegegeven, antwoord vóór de chape.

### 2 Steiger achtergevel afbreken

VAKGEBIED ruwbouw · WIE Marc Van Aken · TEGEN wo 28/10


Pas na het voegwerk van de gevel. Steigerbouwer verwittigen twee dagen op voorhand.

### 3 Voegen gevel nog open

VAKGEBIED ruwbouw · WIE Marc Van Aken · TEGEN vr 9/10

Voegwerk achtergevel boven de keukendeur en naast de achterdeur is nog niet uitgevoerd. De steiger blijft staan tot het voegwerk af is.


**Opmerking (wo 7/10):** Voegmortel is besteld. Met de regen deze week start ik ten vroegste vrijdag.

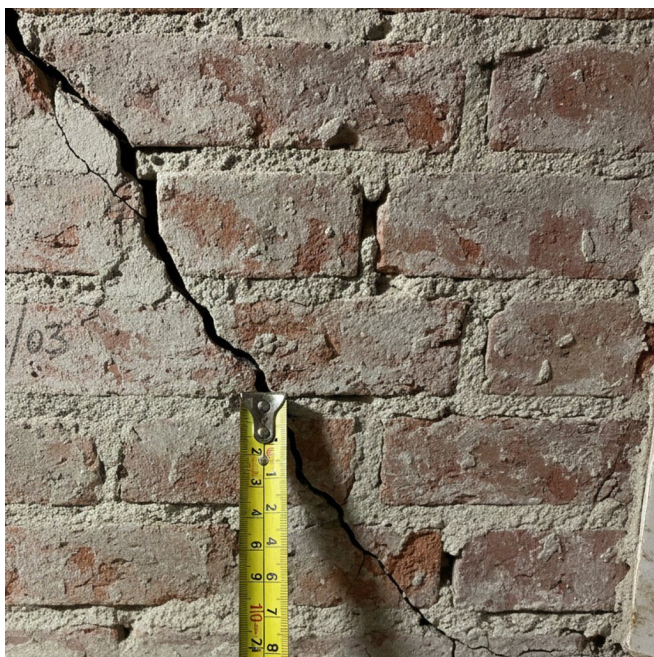

## 4 Wc gelijkvloers aansluiten

VAKGEBIED hvac & sanitair · WIE Kevin Mertens · TEGEN ma 12/10

Hangtoilet aansluiten op de nieuwe afvoer en het inbouwreservoir afpersen.

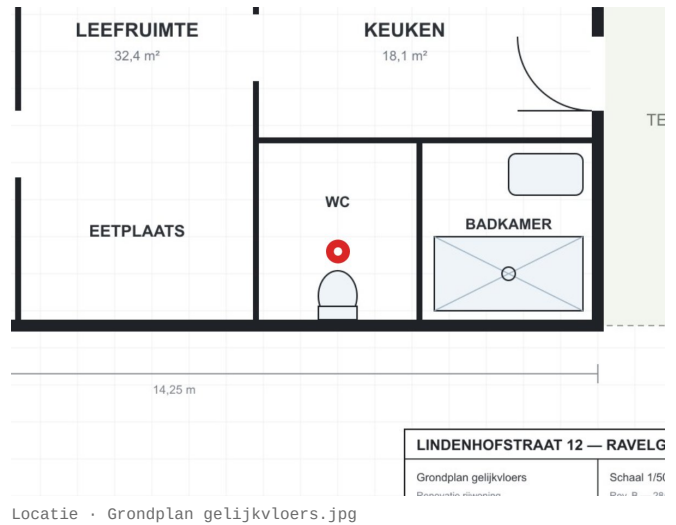

## 5 Asbestattest doorsturen naar bouwheer

VAKGEBIED manager · WIE Jonas Vermeiren · TEGEN **te laat** (do 8/10)

Attest van de asbestinventaris mailen naar familie De Cock, ze hebben het nodig voor de premie.

## 6 Sifon keukenspoelbak plaatsen

VAKGEBIED hvac & sanitair · WIE Kevin Mertens · TEGEN vr 16/10

Nieuwe sifon met aansluiting vaatwasser. Spoelbak staat al op het werkblad.



## 7 Container puin laten wisselen

VAKGEBIED manager · WIE Jonas Vermeiren · TEGEN ma 12/10

Container voor de deur zit vol met de uitbraak van de badkamer. Wissel aanvragen voor maandagvoormiddag.

## 8 Stopcontact naast lavabo verplaatsen

VAKGEBIED elektra · WIE Jonas Vermeiren · TEGEN do 15/10

Stopcontact 20 cm naar links, buiten zone 2 van de douche.


## 9 Afvoer douche 10 cm verleggen


VAKGEBIED hvac & sanitair · WIE Kevin Mertens · TEGEN wo 14/10

De douchebak in de badkamer gelijkvloers schuift 10 cm richting buitenmuur. Afvoer verleggen en afpersen vóór de chape gegoten wordt. Foto van de leidingen nemen voor alles dichtgaat.

**Opmerking (wo 7/10):** Dinsdag lukt niet, de bochten worden pas dinsdag geleverd. Ik doe het woensdag 14/10.

**Opmerking (do 8/10):** Leidingen liggen bloot, foto's genomen voor de chape erover gaat.

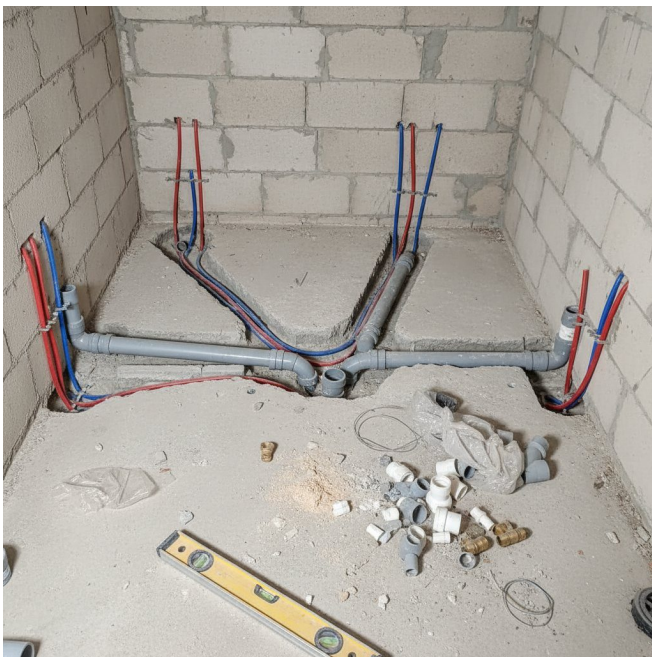

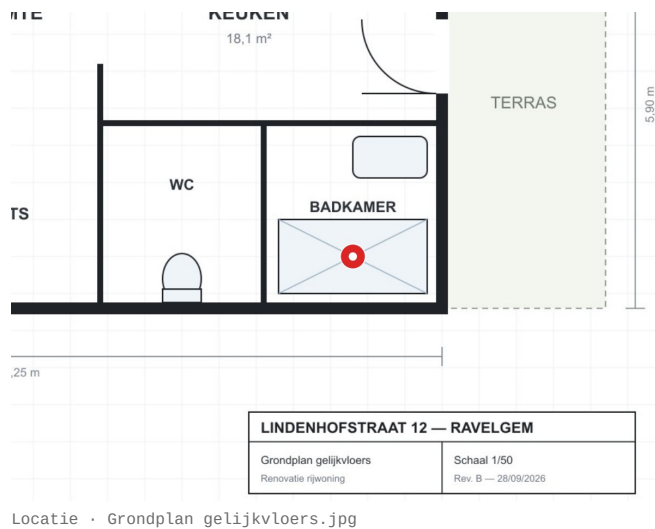


## 10 Chape gelijkvloers (na de afvoer)

VAKGEBIED afwerking · WIE Jos Maes · TEGEN di 20/10

Chape pas gieten als de afvoer van de douche verlegd en afgeperst is. Vloeren Sterbeke heeft dinsdag van volgende week vrijgehouden.


**Opmerking (do 8/10):** Dinsdag 20/10 staat vast, als de afvoer tegen dan afgeperst is.

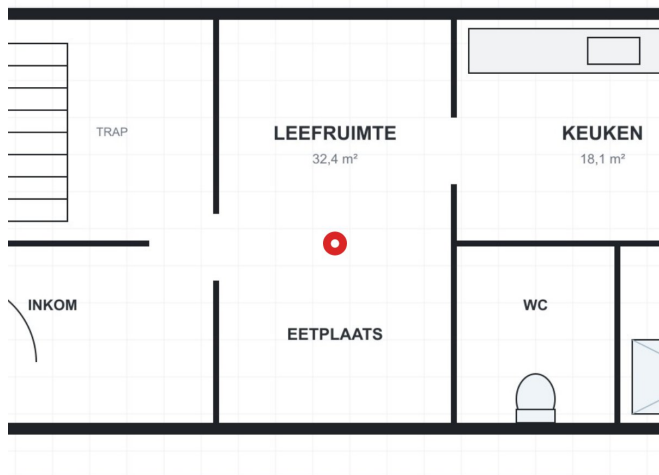

## 11 Dorpel achterdeur: arduin i.p.v. beton

VAKGEBIED ramen & deuren · WIE Jonas Vermeiren · TEGEN vr 16/10

Volgens het aangepaste detail van de architect (rev. B) wordt de dorpel van de achterdeur uitgevoerd in arduin, 5 cm dik met waterhol, in plaats van beton. Maat opmeten na plaatsing van het schrijnwerk.

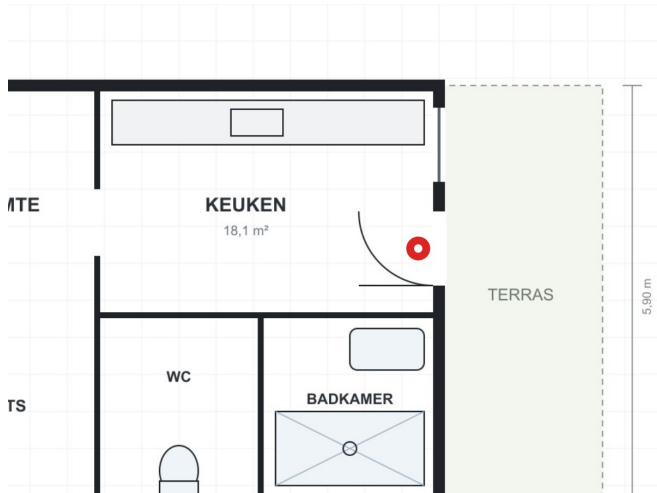

Locatie · Grondplan gelijkvloers.jpg

## AFGEROND SINDS VORIG VERSLAG (1)

## 12 Waterleiding badkamer afpersen

VAKGEBIED hvac & sanitair · WIE Kevin Mertens · TEGEN **afgerond**

Afgeperst op 6 bar, 30 minuten stabiel.
